ARTEX Byggeentreprise A/S

# TIDSPLAN FOR A/B TUREGÅRDEN

T.O. - 19 maj 2011
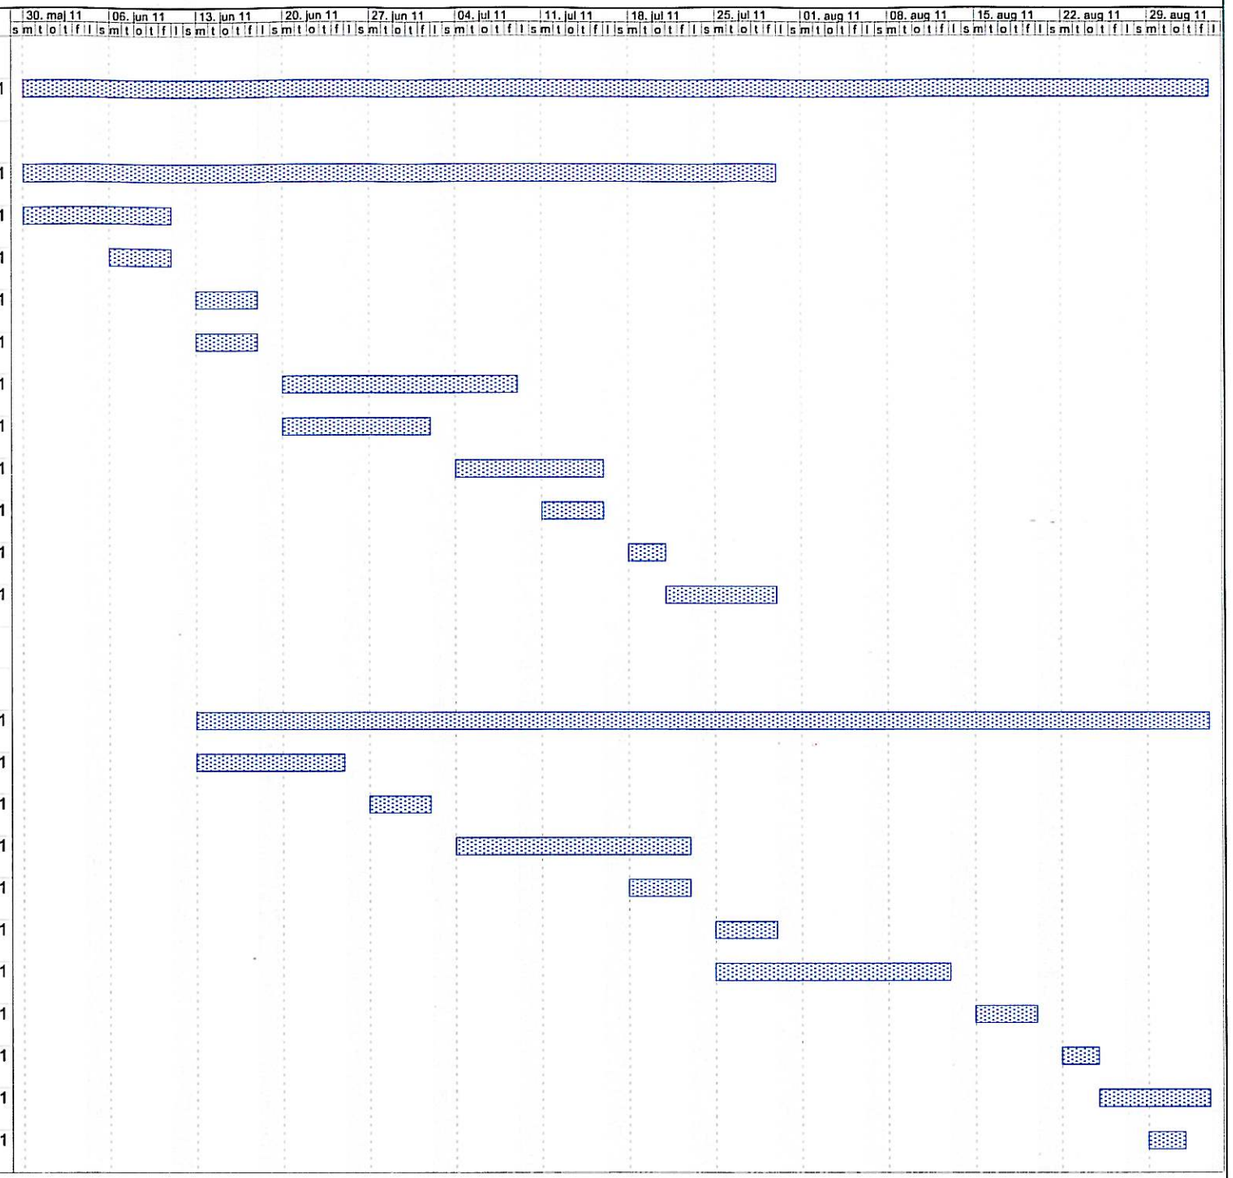
| Id | Opgavenavn | Varighed | Startdato | Sluttdato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | **TIDSPLAN VEDR AB TUREGÅRDEN NANSENSGADE / SCHACKSGADE** | 70 dage | ma 30-05-11 | fr 02-09-11 |
| 3 | | | | |
| 4 | **Schacksgade 7 - 11 / Nansensgade 36 - 38.** | 45 dage | ma 30-05-11 | fr 29-07-11 |
| 5 | Opstilling af stillads på gård- og gadeside. | 10 dage | ma 30-05-11 | fr 10-06-11 |
| 6 | Tilrigning af byggeplads | 5 dage | ma 06-06-11 | fr 10-06-11 |
| 7 | Optagning af tagpap på den yderste meterfra tagfod | 5 dage | ma 13-06-11 | fr 17-06-11 |
| 8 | Fjerne og bortkøre eksist naturskifer på gårdside Schacksgade 11 | 5 dage | ma 13-06-11 | fr 17-06-11 |
| 9 | Gennemgå bræddeunderlag på tagpaptag, påsvejsning af tagpap, zinkinddækninger og tagpap | 15 dage | ma 20-06-11 | fr 08-07-11 |
| 10 | Opretning af spær på gårdside, Schacksgade 11, undertag, afstandslister samt lægter og ovenlys | 10 dage | ma 20-06-11 | fr 01-07-11 |
| 11 | Blikkenslager: Montering af tagrende og naturskifer | 10 dage | ma 04-07-11 | fr 15-07-11 |
| 12 | Blikkenslager: Etablering af div løskanter | 5 dage | ma 11-07-11 | fr 15-07-11 |
| 13 | Mangelgennemgang / mangeludbedring | 3 dage | ma 18-07-11 | on 20-07-11 |
| 14 | Nedtagning af stillads på gade- og gårdside | 7 dage | to 21-07-11 | fr 29-07-11 |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | **Nansensgade 26** | 60 dage | ma 13-06-11 | fr 02-09-11 |
| 18 | Opstilling af stillads på gade- og gårdside samt overdækning | 10 dage | ma 13-06-11 | fr 24-06-11 |
| 19 | Nedrivning af eksist skifer tag | 5 dage | ma 27-06-11 | fr 01-07-11 |
| 20 | Opretning af tag, undertag, afstandslister samt lægter | 15 dage | ma 04-07-11 | fr 22-07-11 |
| 21 | Gennemgang af kviste , 3 stk samt udskiftning af 3 stk ovenlys | 5 dage | ma 18-07-11 | fr 22-07-11 |
| 22 | Udførelse af tagpap dækning på eksist tagpap | 5 dage | ma 25-07-11 | fr 29-07-11 |
| 23 | Pålægning af natur skifer, tagrender samt div inddækninger | 15 dage | ma 25-07-11 | fr 12-08-11 |
| 24 | Malerbehandling af kviste | 5 dage | ma 15-08-11 | fr 19-08-11 |
| 25 | Mangelgennemgang / mangeludbedring | 3 dage | ma 22-08-11 | on 24-08-11 |
| 26 | Nedtagning af stillads | 7 dage | to 25-08-11 | fr 02-09-11 |
| 27 | Afrigning af byggeplads | 3 dage | ma 29-08-11 | on 31-08-11 |
